PODPIS ZAUFANY
DAMIAN
ŁABARCZUK
29.01.2026 14:38:46 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

KARTA TYTUŁOWA

NAZWA I ADRES INWESTORA:	
	**GMINA KROŚNICE** **ul. Sportowa 4** **56-320 Krośnice**
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	**WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJEMNOŚCI 10,0m^3**
LOKALZACJA, ADRES INWESTYCJI:	**SULIRADZICE, 56-320 KROŚNICE**
NR DZIAŁKI:	**DZ. NR 86/3, 173/3, 114/2, AM 1,** **OB. 0017 SULIRADZICE, JEDN. EW. 021302_2 KROŚNICE**
STADIUM:	**OPRACOWANIE TECHNICZNE**

PROJEKTOWAŁ	**NR UPRAWNIEŃ**	**PODPIS**
mgr inż. Damian Łabarczuk	DOŚ/0194/PBKb/23	
DATA WYKONANIA:	**15.12.2025r**	

I. DANE OGÓLNE

Zamierzenie:	Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10,0m^3
Adres:	dz. nr 86/3, 173/3, 114/2, AM 1, ob. 0017 Suliradzice, jedn. ew. 021302_2 Krośnice
Inwestor:	Gmina Krośnice ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice
Stadium:	Opracowanie techniczne
Termin opracowania:	15.12.2025r

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Obowiązujące przepisy, normy, wytyczne i rozporządzenia
- Mapa zasadnicza
- Decyzja nr 132/2025

III. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest opracowanie techniczne zamierzenia budowlanego, polegające na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne o pojemności 10,0m^3 do realizacji na dz. nr 86/3, 173/3, 114/2, AM 1, obręb Suliradzice, gmina Krośnice.

IV. OPRACOWANIE TECHNICZNE

1. OPRACOWANIE TECHNICZNE

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szambo szczelne) o pojemności V=10m3 na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanego na działce nr działka nr ew. 86/3. Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika poprzez rurę PVC średnicy 160mm SN8. Pod pasem drogowym przewidziano dodatkowo rurę osłonową stalową średnicy 200mm umieszczoną na głębokości min. 120cm. Dodatkowo zaprojektowano dwie studzienki rewizyjne 315/160.

Budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane, którego dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

1.2. Dane techniczne

Pojemność użytkowa	10,0 m3
Długość	3,0 m
Szerokość	2,4 m
Wysokość bez płyty górnej	2,50 m

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Zbiornik projektowany jako zbiornik prefabrykowany, jednokomorowy o pojemności użytkowej 10m3 do okresowego magazynowania ścieków sanitarnych odprowadzanych z budynku świetlicy wiejskiej. Bryła zbiornika jest prostopadłościanem, posadowionym poniżej poziomu terenu. Zbiornik powinien być opróżniany cyklicznie wozem asenizacyjnym.

1.4. Warunki lokalizacyjne

Projekt wykonano przy założeniu, że poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu projektowanego posadowienia oraz dopuszczalne naprężenie gruntu w poziomie posadowienia wynosi 0,15MPa. Sam zbiornik jest konstrukcją nośną. Nie wymaga specjalnych fundamentów ani obmurowań. Projektowany zbiornik nie będzie też w żaden sposób wpływał pogarszająco na stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego pogorszenie.

1.5. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne

Wykop - wykop powinien być szerszy od wymiarów zewnętrznych zbiornika o ok. 50cm w jego szerokości i długości. Dno wykopu powinno być dobrze wypoziomowanie. W głębokości wykopu należy uwzględnić podsypkę piaskową gr 10 cm. Wykop należy wykonać w dniu montażu zbiornika. Przyłącze - przyłącze instalacji kanalizacyjnej z rury PCV Ø 160mm. Przejście przez ścianę komory szczelne.

Szczelność zbiornika jest sprawdzana u wytwórcy i jest gwarantowana użytkownikowi. Zbiornik przed wykonaniem izolacji i obsypaniem powinien być poddany próbie szczelności. Obsypanie zbiornika wykonać warstwami co 30 cm z dokładnym zagęszczeniem.
Kanalizację sanitarną należy zakończyć systemem odpowietrzenia wyprowadzonym co najmniej 0,5m ponad poziom terenu Kanalizacja sanitarna powinna być realizowana zgodnie z instrukcją producenta. Materiały i wyroby powinny posiadać atesty i certyfikaty na wbudowane wyroby budowlane.

1.6. Rozwiązania kolizji

W miejscu kolizji z istniejącą linią telekomunikacyjną projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w rurze osłonowej, zapewniającej ochronę mechaniczną przewodu kanalizacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Rurę osłonową zaprojektowano o długości obejmującej całą strefę kolizji, z wyprowadzeniem poza jej obrys. Roboty ziemne w obrębie kolizji należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i zabezpieczeniem istniejącej sieci. **Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci telekomunikacyjnej oraz prowadzić prace zgodnie z jego wytycznymi.**

Nr konc.:GK.6642.958.2025

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: **STAROSTA MILICKI**

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.0213.2015.0017

Nazwa materiału zasobu: MAPA ZASADNICZA


Data wykonania kopii materiału zasobu: 2025.11.04

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Dokument podpisany elektronicznie

Województwo: dolnośląskie
Powiat: milicki
Jednostka ewidencyjna: 021302_2, Krośnice
Obręb: 0017, Suliradzice

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Martę Ryszardę Sigmund-Buchert
POWIATOWE W MILICZU
Data: 2025.11.04 11:00:51 CET

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:500
Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.156.16.04.3.2; 6.156.16.04.1.4

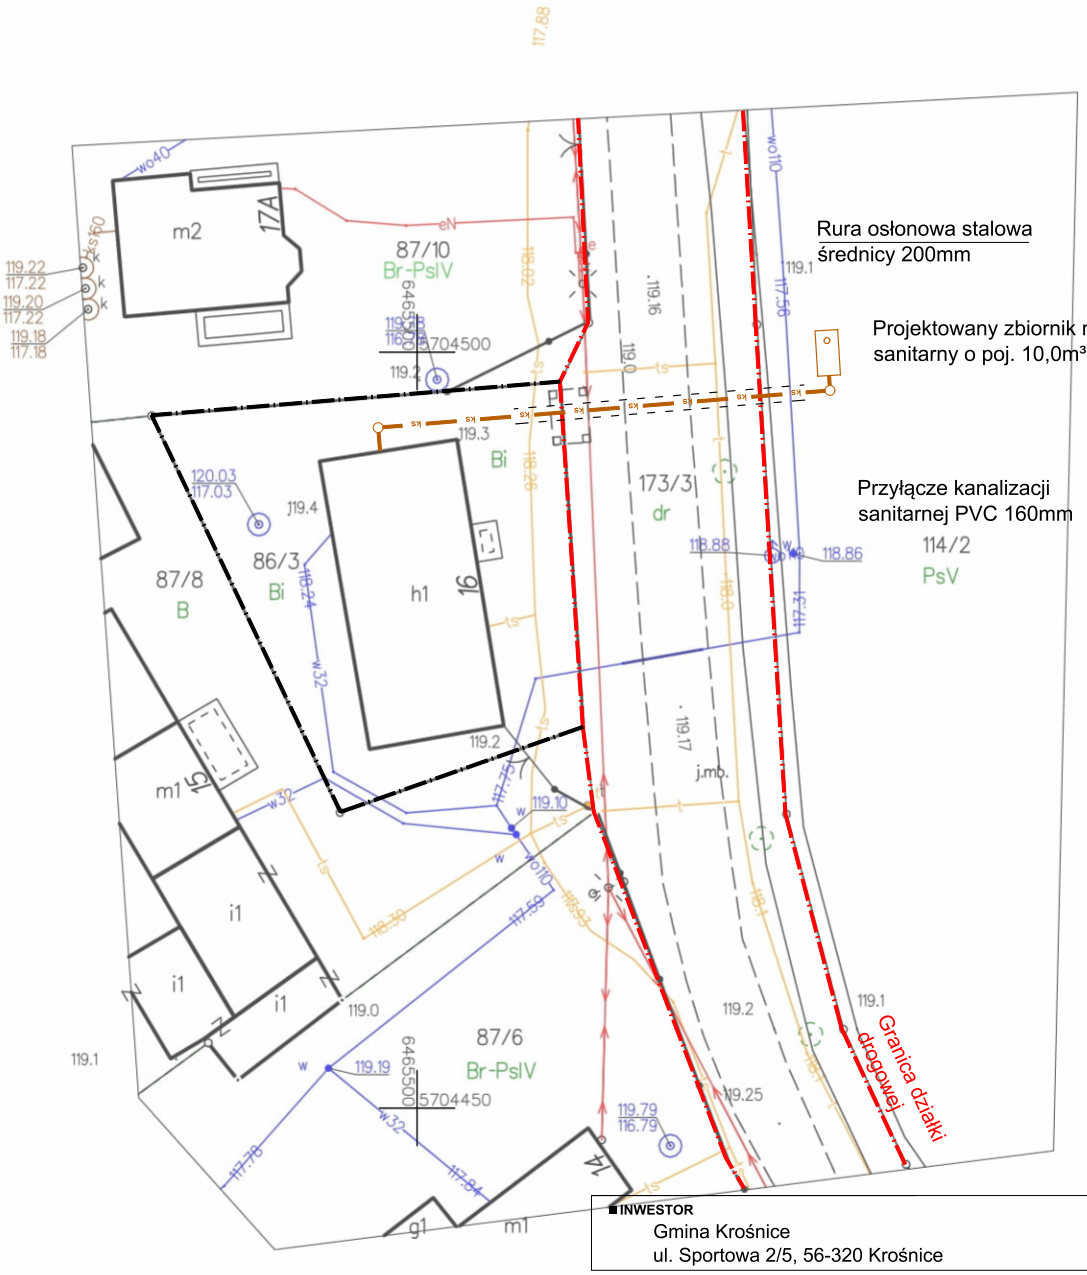

INWESTOR
Gmina Krośnice
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krośnice

OBIEKT
Zbiornik bezodpływowy

ADRES
dz. nr 86/3, 173/3, 114/2, AM 1, ob. 0017 SULIRADZICE, jedn. ew. 021302_2 KROŚNICE


PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Damian Łabarczuk	DOŚ/0194/PBKb/23	


DATA	SKALA	TYTUŁ RYSUNKU	NR RYS
15.12.2025	1:500	PLAN SYTUACYJNY	P-1

Milicz dn. 04.11.2025
Sporządził(a) wydruk: Barbara Stępień-Buchert

Wszelkie prawa zastrzeżone Reproduction without permission is prohibited

RYSUNEK TECHNICZNY
Zbiornik na ścieki

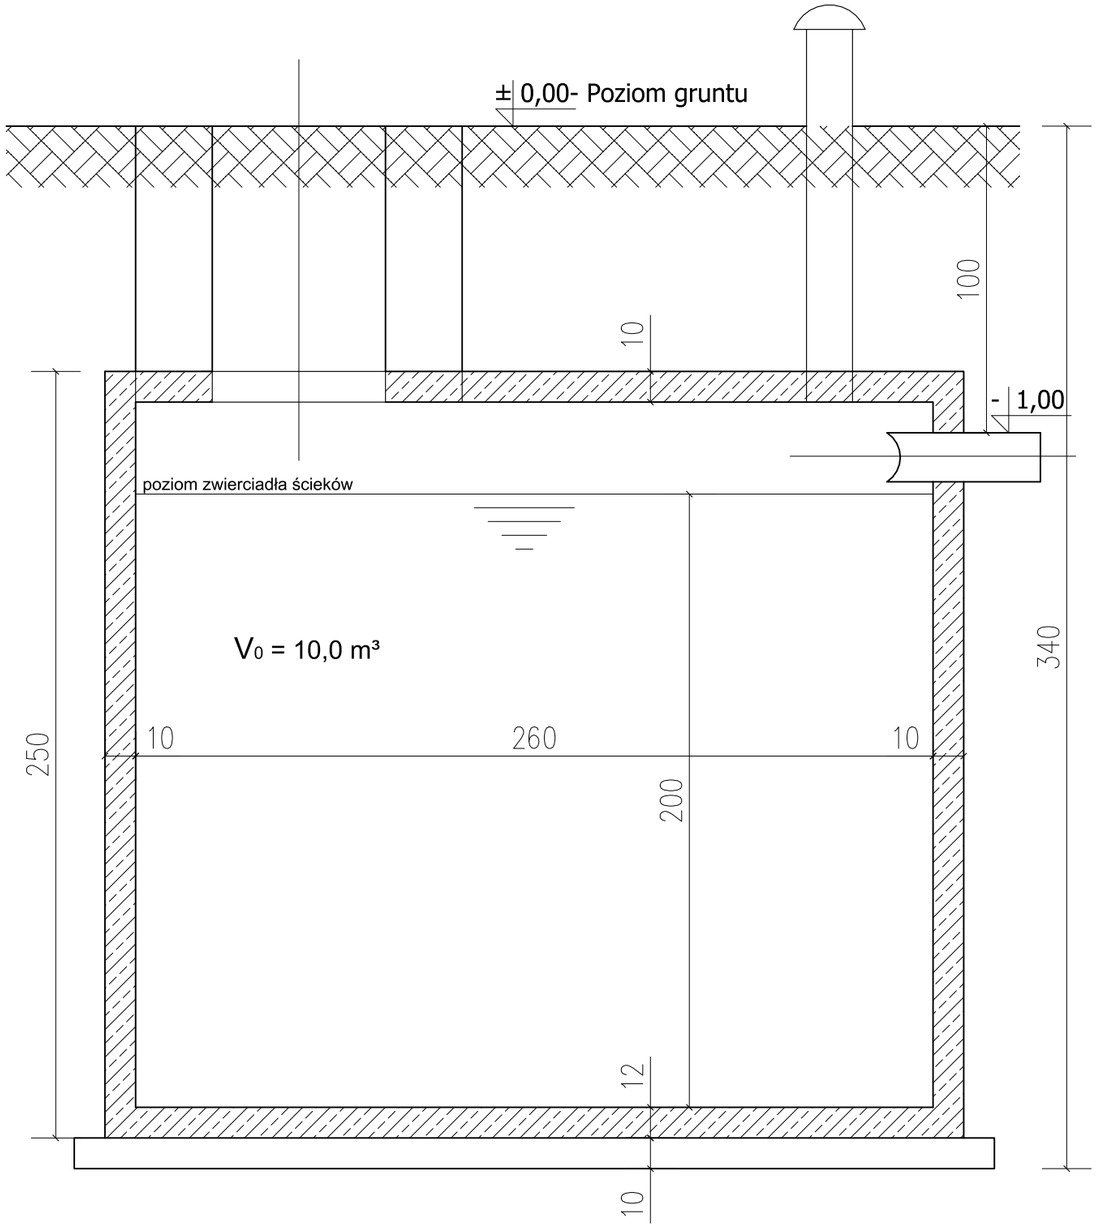

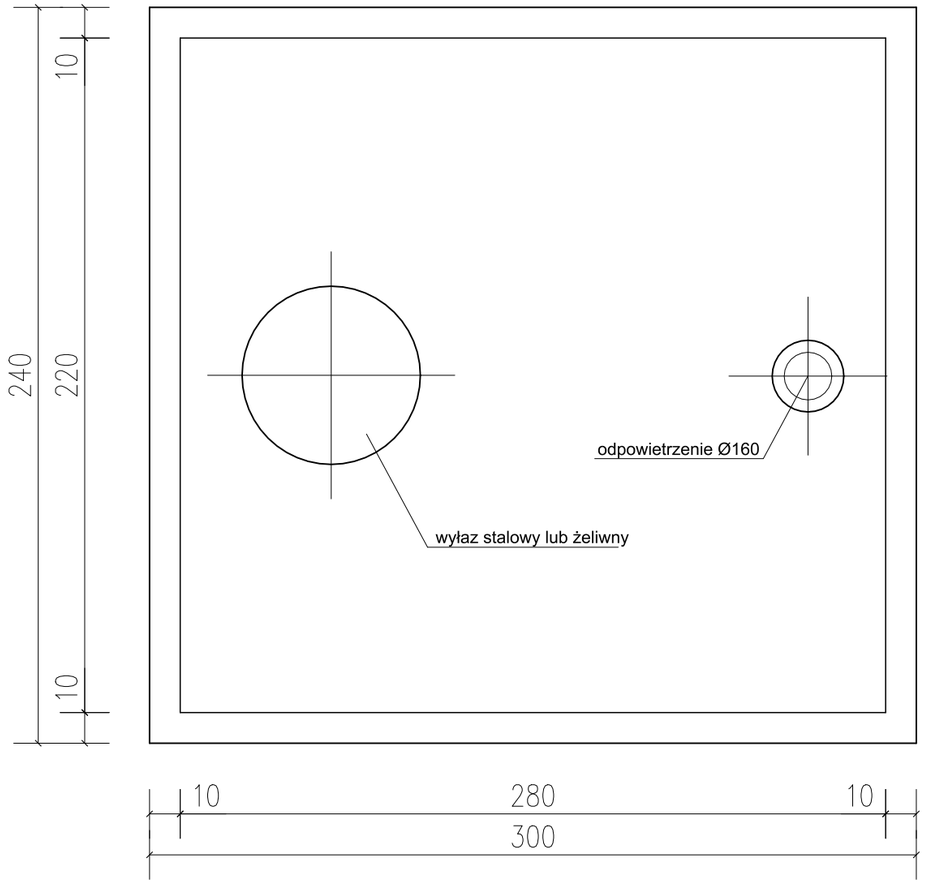

UWAGI
1. Podkład pod zbiornik bezodpływowy wykonać z betonu klasy C10/15 (B15) grubości 10 cm na podsypce piaskowo-żwirowej grubości 10 cm zagęszczonej mechanicznie.
2. Płyta denna gr. 12 cm oraz ściany i płyta stropowa gr. 10 cm zbiornika bezodpływowego żelbetowe, monolityczne, zbrojone prętami żebrowanymi lub siatkami z prętów #12 i 8 mm ze stali A-III i A-I.
3. Zbiornik bezodpływowy z betonu szczelnego klasy min. C20/25 (B 25) z dodatkiem środka wodoszczelnego.
4. Dostęp do zbiornika poprzez właz żeliwny Ø600 mm typu "ciężkiego".
5. Odpowietrzenie zbiornika rurą PCV Ø160 mm wyprowadzoną na wysokość 0,5 m p.p.t.

■ INWESTOR Gmina Krośnice ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krośnice			
■ OBIEKT Zbiornik bezodpływowy			
■ ADRES dz. nr 86/3, 173/3, 114/2, AM 1, ob. 0017 SULIRADZICE, jedn. ew. 021302_2 KROŚNICE			
■ PROJEKTOWAŁ mgr inż. Damian Łabarczuk	■ NR UPRAWANIEŃ DOŚ/0194/PBKb/23	■ PODPIS	
■ DATA 15.12.2025	■ SKALA 1:20	■ TYTUŁ RYSUNKU **RZUT ZBIORNIKA**	■ NR RYS **P-2**

Wszelkie prawa zastrzeżone Reproduction without permission is prohibited
