


# Ewaluacja okresowa za lata 2017-2018

## Gminnego Programu Rewitalizacji

### Gminy Krośnice na lata 2016-2023

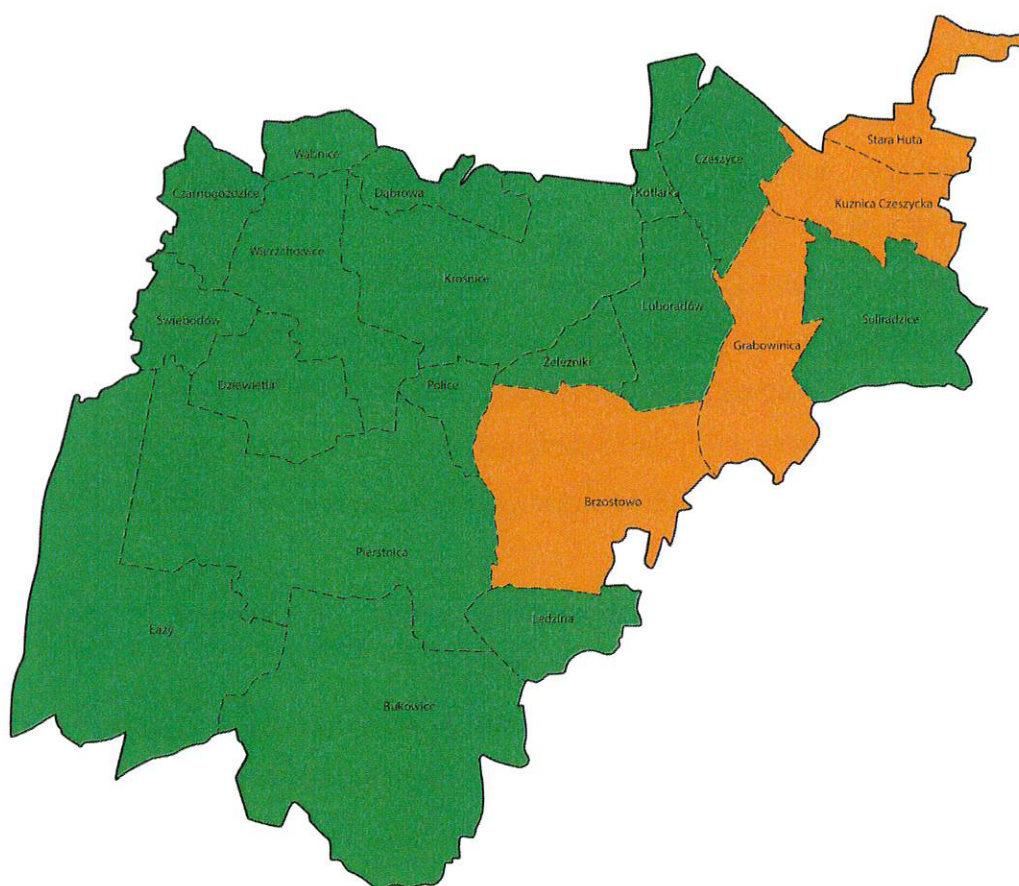

Krośnice 2019

## **Wprowadzenie**

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 przyjęto do realizacji uchwałą nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27.06.2017r. zmieniającą uchwałę nr XXXII/178/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2016r. Dokument po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 i znalazł się na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego.

GPR to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Ewaluacja okresowa Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 została opracowana na podstawie zebranych kart zadań i ankiet ewaluacyjnych za lata 2017 i 2018 oraz pozyskanych danych i dokonanych wyliczeń przez Referat Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Krośnice, który jest operatorem procesu rewitalizacji w Gminie Krośnice. Raport stanowi podsumowanie i średniookresową ocenę programu w latach 2017-2018.

Opracowany Raport podzielony został na cztery części. W pierwszej części omówiono podstawy prawne i metodyczne opracowania ewaluacji.

W drugiej części przedstawiono wyniki monitoringu działań przewidzianych w programie w latach 2017-2018. W rozdziale zaprezentowano wyniki raportu zmian fizycznych jakie zaszły w obszarze rewitalizacji w omawianym okresie. Ważnym elementem tej części opracowania był opis stanu realizacji projektów wskazanych do realizacji w programie rewitalizacji.

Część trzecia poświęcona została ewaluacji programu. W tym rozdziale wskazano efekty programu osiągnięte w latach 2017-2018 na podstawie celów i wskaźników realizacji programu.

Ostatnia część opracowania to rekomendacje do dalszych prac, których celem jest zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia stanowiące istotne wyzwanie w kontekście wdrażania programu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w programie.

## **I. Podstawy prawne i metodyczne opracowania ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023**

Obecnie obowiązujące przepisy i wytyczne w zakresie prowadzenia procesów rewitalizacji dużo miejsca poświęcają zagadnieniu monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacji. W ustawie o rewitalizacji założono, że Gminny Program Rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji dokonywanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, a ocena sporządzona przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

### **Monitoring procesu rewitalizacji**

Monitoring to regularne zbieranie i analiza danych na temat realizacji projektów w trakcie ich przebiegu. Dzięki monitoringowi sprawdzana jest zgodność przebiegu realizacji projektu z wcześniejszymi planami i założeniami, zarówno w aspekcie rzeczowym, jak i finansowym.

Monitoring procesu rewitalizacji to systematyczne rejestrowanie i raportowanie postępów procesu rewitalizacji. Monitoring projektu to bezpośredni efekt konkretnego projektu.

Koordinowanie i monitorowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 należy do zadań Referatu Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Krośnice. Referat ten odpowiada za gromadzenie, dostarczanie i analizowanie danych oraz diagnozę i identyfikację aktualnych zagadnień związanych z realizacją Programu.

Monitorowanie odbywa się poprzez badanie osiągnięć Programu, w tym efektów rzeczowych projektów – stan zaawansowania realizacji projektów ujętych w Programie.

Monitorowanie realizacji projektów w okresach rocznych odbywa się w oparciu o karty zadań i ankiety ewaluacyjne dla każdego projektu. Brak karty zadań i ankiety ewaluacyjnej dla konkretnego projektu w danym roku jest równoznaczne z deklaracją, że projekt w danym roku nie był realizowany.

Monitoring to systematyczna i obiektywna ocena wartości trwającego lub zakończonego projektu, uwzględniająca sposób jego realizacji oraz osiągane rezultaty.

### **Ewaluacja procesu rewitalizacji**

Celem ewaluacji jest sprawdzenie, czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, czy osiąga zaplanowane cele oraz czy zmiany wywołane jego realizacją można uznać za trwałe.

;

;

;

;

Niniejsza analiza ma na celu ustalenie stopnia realizacji sformułowanych celów i zaplanowanych przedsięwzięć.

Zbiorczy raport w cyklu trzyletnim przekazywany jest za pośrednictwem Kierownika Referatu Funduszy Europejskich Wójtowi Gminy Krośnice w terminie do dnia 30 czerwca. Następnie wójt zatwierdza raport i przekazuje go Komitetowi Rewitalizacji w terminie do dnia 31 lipca. Komitet Rewitalizacji opiniuje raport i przekazuje swoje zalecenia i uwagi Wójtowi w terminie do dnia 30 września. Po uzyskaniu opinii Komitetu Rewitalizacji, wójt przekazuje raport niezwłocznie Radzie Gminy do zaopiniowania.

Monitorowanie osiągnięć programu odbywa się za pomocą zestawu wskaźników, których wartość jest wyliczana na podstawie zbieranych w tym celu aktualnych danych dla obszaru rewitalizacji.

## II. Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 w latach 2017-2018

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 wskazano do realizacji 41 projektów. Do końca 2018 roku zakończono 7 projektów, w trakcie realizacji było 14 projektów, a dla 2 projektów zostały wykonane dokumentacje projektowe. Łącznie w roku 2017 i 2018 na realizację projektów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 716 900,08 zł, co stanowi 20,20% budżetu programu. Szczegółowa lista projektów, wraz z informacją na temat zaangażowanych środków i stopnia realizacji przedsięwzięć przedstawiona została w tabeli nr 1.

**Tabela 1 Stan realizacji projektów wskazanych do realizacji w programie rewitalizacji**

Nr projektu	Nazwa projektu	Koszty poniesione do końca 2018r.	Koszty planowane do poniesienia	Stopień realizacji przedsięwzięcia [w %]		Planowany/faktyczny termin zakończenia projektu
				produkt	rezultat	
1/SP	Aktywni na rynku pracy	22 714,86	177 285,14	10%	5%	2023
2/SP	Promocja aktywnego stylu życia	0,00	180 000,00	25%	0%	2023
3/SP	Edukacja, aktywizacja, zabawa	16 050,00	333 950,00	33,47%	0%	2023
4/SP	Głowa do góry. Nie jesteś sam.	1 100,00	108 900,00	5,33%	0%	2023
5/SP	Bezpieczny uczeń	0,00	45 000,00	28,56%	0%	2023
6/SP	Aktywizacja seniorów	3 600,00	101 400,00	67,65%	28%	2023
7/SP	Coroczny festyn rodzinny w Kuźnicy Czeszyckiej	10 000,00	35 000,00	28,56%	0%	2023
8/SP	Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	49 000,00	0%	0%	2023
1/1/INF	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 201, 203 (Kuźnica Cz.)	375 260,16	284 739,84	29,30%	0%	2018
1/2/INF	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjnej nr 192 (Kuźnica Cz.)	0,00	160 000,00	0%	0%	2023
1/3/INF	Przebudowa drogi na terenie ARIMR oraz odcinka drogi gminnej położonych na działkach nr 27, 209/5, 33/1 (Kuźnica Cz.)	50 095,58	-	100%	100%	2018

1/4/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 208 (Kuźnica Cz.)	0,00	300 000,00	0%	0%	2023
1/5/INF	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1436 i 1446 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Kuźnica Cz.)	2 500,00	1322500,00	0%	0%	2023
1/6/INF	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych na działkach nr 129/8 i 202 (Kuźnica Cz.)	32 462,93	117 537,07	33,33%	0%	2020
1/7/INF	Zmiana technologii uzdatniania wody w stacji w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z modernizacją SUW oraz modernizacją przepompowni sieciowej i budowa sieci tranzytowej o długości 4,082 km (Kuźnica Cz.)	1822501,34	-	100%	100%	2018
1/8/INF	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (Kuźnica Cz.)	0,00	400 000,00	0%	0%	2020
1/9/INF	Budowa zewnętrznej siłowni fitness przy świetlicy wiejskiej (Kuźnica Cz.)	3 800,00	46 200,00	0%	0%	2021
1/10/INF	Wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej i matematycznej w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00	100 000,00	0%	0%	2020
1/11/INF	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o 10 miejsc parkingowych	0,00	40 000,00	0%	0%	2020
1/12/INF	Rozbudowa Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o pomieszczenia do wydawania posiłków, zmywalnię oraz stołówkę	0,00	250 000,00	0%	0%	2022
2/1/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 254 od skrzyżowania do boiska gminnego (Grabownica)	52 532,12	-	100%	100%	2018
2/2/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 255 wraz z budową oświetlenia ulicznego i chodnikiem na odcinku na wysokości od działki nr 25/1 do działki 30/3 (Grabownica)	90 346,89	1440000,00	33,33%	0%	2023
2/3/INF	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1436 (Grabownica)	0,00	25 000,00	0%	0%	2020
2/4/INF	Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia techniczno-socjalne wraz z węzłem sanitarnym (Grabownica)	39 369,95	260 630,05	0%	0%	2022
2/5/INF	Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP (Grabownica)	13 867,50	31 132,50	0%	0%	2022
2/6/INF	Budowa boiska wraz z zakupem i montażem bramek i ławek (Grabownica)	0,00	100 000,00	0%	0%	2023
2/7/INF	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 256 obręb Grabownica oraz nr 219 obręb Brzostowo o łącznej długości ok. 3,5 km	0,00	1300000,00	0%	0%	2023
3/1/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 222 (Brzostowo z Brzostówkiem)	43 292,44	-	100%	100%	2018
3/2/INF	Przebudowa drogi na działce nr 104/12 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Brzostowo z Brzostówkiem)	0,00	100 000,00	0%	0%	2023
3/3/INF	Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 104/39 (Brzostowo z Brzostówkiem)	0,00	90 000,00	0%	0%	2023
3/4/INF	Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 241/10 w Brzostówku wraz z budową oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	0%	0%	2023
3/5/INF	Modernizacja boiska wraz z zakupem wyposażenia (bramki, ławki) (Brzostowo z Brzostówkiem)	6 000,00	94 000,00	0%	0%	2023
3/6/INF	Termomodernizacja budynku remizy OSP (Brzostowo z Brzostówkiem)	22 694,00	-	100%	100%	2017
3/7/INF	Budowa drogi gminnej na działkach nr 256 obręb Grabownica oraz nr 219 obręb Brzostowo o łącznej długości ok. 3,5 km	0,00	1300000,00	0%	0%	2023
3/8/INF	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie OSP oraz placu zabaw na cele integracji społeczności wiejskiej (Brzostowo z Brzostówkiem)	22 329,54	78 670,46	0%	0%	2023
3/9/INF	Zakup i montaż przystanków PKS w Brzostowie i Brzostówku	0,00	15 000,00	0%	0%	2020
4/1/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 362 i 363 (Stara Huta)	0,00	303 600,00	0%	0%	2023
4/2/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 375/3 (Stara Huta)	62 794,96	-	100%	100%	2018
4/3/INF	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1435 (Stara Huta)	18 587,81	-	100%	100%	2017
4/4/INF	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej (Stara Huta)	0,00	100 000,00	0%	0%	2023
4/5/INF	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1437 na odcinku 1,1 km (Stara Huta)	0,00	200 000,00	0%	0%	2023

Zjawiskiem pozytywnym jest fakt, że po dwóch pierwszych latach funkcjonowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 zwydatkowano środki w wartości 20,20% budżetu Programu.

Opóźnienie w terminie realizacji projektów założonych w Programie odnotowano w:

a) projekt 1/7/INF pn.: „Zmiana technologii uzdatniania wody w stacji w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z modernizacją SUW oraz modernizacją przepompowni sieciowej i budowa sieci tranzytowej o długości 4,082 km” przewidziany był do realizacji w latach 2016-2017. Jednak ze względu na kwestie związane z wydłużeniem robót budowlanych dokończenie realizacji projektu zostało przesunięte i zakończone w 2018 roku.

b) projekt 1/1/INF pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 201, 203” realizowany w Kuźnicy Czeszyckiej przewidziany do realizacji w Programie był w latach 2016-2018. Jednak ze względu na brak środków, dokończenie realizacji projektu będzie musiało zostać przesunięte na kolejne lata.

Pozostałe projekty przewidziane do realizacji w latach późniejszych planuje się realizować w terminach wskazanych w programie.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w GPR podzielone zostały na typy przedsięwzięć, tj. społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne, co przedstawiono w tabeli nr 2.

**Tabela 2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w podziale na typy przedsięwzięć**

Typ przedsięwzięcia	Nazwa projektu
Społeczne	2/SP Promocja aktywnego stylu życia
	3/SP Edukacja, aktywizacja, zabawa
	4/SP Głowa do góry. Nie jesteś sam.
	6/SP Aktywizacja seniorów
	7/SP Coroczny festyn rodzinny w Kuźnicy Czeszyckiej
	1/10/INF Wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej i matematycznej w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej
	1/12/INF Rozbudowa Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o pomieszczenia do wydawania posiłków, zmywalnię oraz stołówkę
Gospodarcze	1/SP Aktywni na rynku pracy
	8/SP Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich
Środowiskowe	1/7/INF Zmiana technologii uzdatniania wody w stacji w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z modernizacją SUW oraz modernizacją przepompowni sieciowej i budowa sieci tranzytowej o długości 4,082 km (Kuźnica Cz.)
Przestrzenno-funkcjonalne	5/SP Bezpieczny uczeń
	1/1/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 201, 203 (Kuźnica Cz.)
	1/2/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjnej nr 192 (Kuźnica Cz.)
	1/3/INF Przebudowa drogi na terenie ARIMR oraz odcinka drogi gminnej położonych na działkach nr 27, 209/5, 33/1 (Kuźnica Cz.)
	1/4/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 208 (Kuźnica Cz.)

	1/5/INF Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1436 i 1446 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Kuźnica Cz.)
	1/6/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych na działkach nr 129/8 i 202 (Kuźnica Cz.)
	1/8/INF Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (Kuźnica Cz.)
	1/9/INF Budowa zewnętrznej siłowni fitness przy świetlicy wiejskiej (Kuźnica Cz.)
	1/11/INF Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o 10 miejsc parkingowych
	2/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 254 od skrzyżowania do boiska gminnego (Grabownica)
	2/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 255 wraz z budową oświetlenia ulicznego i chodnikiem na odcinku na wysokości od działki nr 25/1 do działki 30/3 (Grabownica)
	2/3/INF Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1436 (Grabownica)
	2/5/INF Dopuszczenie placu zabaw przy remizie OSP (Grabownica)
	2/6/INF Budowa boiska wraz z zakupem i montażem bramek i ławek (Grabownica)
	2/7/INF, 3/7/INF Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 256 obręb Grabownica oraz nr 219 obręb Brzostowo o łącznej długości ok. 3,5 km
	3/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 222 (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/2/INF Przebudowa drogi na działce nr 104/12 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/3/INF Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 104/39 (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/4/INF Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 241/10 w Brzostówku wraz z budową oświetlenia ulicznego
	3/5/INF Modernizacja boiska wraz z zakupem wyposażenia (bramki, ławki) (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/8/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie OSP oraz placu zabaw na cele integracji społeczności wiejskiej (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/9/INF Zakup i montaż przystanków PKS w Brzostowie i Brzostówku
	4/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 362 i 363 (Stara Huta)
	4/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 375/3 (Stara Huta)
	4/3/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1435 (Stara Huta)
	4/4/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej (Stara Huta)
	4/5/INF Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1437 na odcinku 1,1 km (Stara Huta)
Techniczne	2/4/INF Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia techniczno-socjalne wraz z węzłem sanitarnym (Grabownica)
	3/6/INF Termomodernizacja budynku remizy OSP (Brzostowo z Brzostówkiem)

Natomiast w tabeli nr 3 przedstawiono jaki jest stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w poszczególnych typach przedsięwzięć.

**Tabela 3 Stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych pod względem podziału na typy przedsięwzięć**

Typ przedsięwzięcia	Wskaźnik	Odsetek przedsięwzięć zapisanych w GPR, w których stopień realizacji wynosi						Suma (a+b+c+d+e+f)
		0%	<0% oraz >25%	<25% oraz >50%	<50% oraz >75%	<75% oraz >100%	100%	
		a	b	c	d	e	f	
Przedsięwzięcia społeczne i gospodarcze	produkt	33,33%	33,33%	22,23%	11,11%	0,00%	0,00%	100,00%
	rezultat	77,78%	11,11%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Przedsięwzięcia środowiskowe	produkt	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	rezultat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Przedsięwzięcia przestrzenno-funkcjonalne	produkt	68,97%	0,00%	13,79%	0,00%	0,00%	17,24%	100,00%
	rezultat	82,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,24%	100,00%
Przedsięwzięcia techniczne	produkt	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
	rezultat	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
Wszystkie przedsięwzięcia	produkt	60,98%	4,88%	17,07%	0,00%	0,00%	17,07%	100,00%
	rezultat	80,49%	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	17,07%	100,00%

Biorąc pod uwagę sparametryzowany stopień degradacji, czyli zdiagnozowane zjawiska kryzysowe, rozwarstwianie społeczne, negatywne nasilające się trendy demograficzne, zagrożenie związane z marginalizacją przestrzeni i społeczności lokalnej, kulturowe wartości i znaczenie dla tożsamości gminy, wciąż priorytetowym jest podejmowanie działań rewitalizacyjnych na obszarach wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023.

Podjęte i zrealizowane działania odpowiadają częściowo na zdiagnozowane potrzeby. Skala potrzeb jest jednak wciąż ogromna, a obserwowane zjawiska i trendy demograficzne wskazują, że prowadzenie dalszych działań rewitalizacyjnych będzie coraz trudniejsze.

### **III. Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 w latach 2017-2018**

Rezultaty wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana jest na podstawie zbieranych w tym celu aktualnych danych dla obszaru rewitalizacji. Dostarczają one informacji dotyczących wskaźników rezultatu, a więc efektów realizacji przedsięwzięć ujętych w Programie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników skupiony jest na ocenie osiągnięcia celów Programu, a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika to z postrzegania interwencji w ramach rewitalizacji jako procesu całościowego, który nie jest prostą sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych obszarach poddanych rewitalizacji. Zebrane dane zaprezentowane zostały w tabeli nr 4.



**Tabela 4 Wskaźniki monitorowania postępu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika w diagnozie		Wartość wskaźnika bieżąca		Zmiana wartości wskaźnika		Wartość docelowa wskaźnika	
		Obszar rewitalizacji	Gmina	Obszar rewitalizacji	Gmina	Obszar rewitalizacji	Gmina	Obszar rewitalizacji	Gmina
1.	Zmniejszenie liczby osób zamieszkujących na obszarze rewitalizacji korzystających ze świadczeń opieki społecznej oferowanych przez GOPS	156 osób/rok	1119 osób/rok	156 osób/rok	1068 osób/rok	-	-51 osób/rok	100 osób/rok	nd
2.	Wskaźnik aktywności gospodarczej (zarejestrowana działalność gospodarcza w stosunku do liczby ludności)	6,21%	7,01%	3,92%	5,70%	-2,29%	-1,31%	7,50%	nd
3.	Zmniejszenie udziału osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia na obszarze rewitalizacji w ogólnej populacji pozbawionych pracy	30,33%	16,50%	26,92%	15,94%	-3,41%	-0,56%	20%	nd

Wybór wskaźników skupił się przede wszystkim na zapewnieniu adekwatnych mierników poszczególnych celów strategicznych:

- **Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących na obszarze rewitalizacji korzystających ze świadczeń opieki społecznej oferowanych przez GOPS** – wskaźnik mierzy kluczową dla GPR zmianę w obszarze poprawy sytuacji mieszkańców gminy, których sytuacja życiowa i materialna zmusza do korzystania z systemu pomocy społecznej. W GPR zakłada się, iż zaplanowana interwencja pozwoli na poprawę jakości ich życia, zwiększy skuteczność funkcjonowania na rynku pracy, itp.
- **Wskaźnik aktywności gospodarczej** – zakłada się, iż podjęte działania rewitalizacyjne przyczynią się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców. Dzięki temu zyskają oni nowe miejsca pracy, wpłynie to na poprawę jakości ich życia. Wskaźnik ten traktowany jest również jako ważny wyznacznik podnoszenia jakości życia, dotyczy wyłącznie obszaru rewitalizacji.
- **Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku do 25 r.ż. na obszarze rewitalizacji w ogólnej populacji pozbawionych pracy** – jednym z ważnych zidentyfikowanych problemów w obszarze rewitalizacji jest trudna sytuacja na rynku pracy osób młodych. Dlatego, iż z punktu widzenia skutecznego funkcjonowania na rynku pracy szczególnie ważny jest początek kariery zawodowej, w ramach GPR zaplanowano działania mające na

celu poprawę sytuacji zawodowej osób młodych (edukacja, aktywizacja, itp.). Wskaźnik pozwoli na ocenę skuteczności tej interwencji.

W tabeli nr 4 możemy zauważyć, iż bieżąca wartość wskaźnika pn.: Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących na obszarze rewitalizacji korzystających ze świadczeń opieki społecznej oferowanych przez GOPS na obszarze rewitalizacji nie uległa zmianie w porównaniu do wartości wskaźnika w diagnozie. Natomiast na obszarze gminy wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu. Oznacza to, że sytuacja na obszarze rewitalizowanym nie ulega poprawie w porównaniu do obszaru całej gminy. Jeśli po przeprowadzeniu kolejnej ewaluacji okresowej, sytuacja ta nie polepszy się, będzie trzeba poszukać przyczyny oraz zastanowić się nad rozwiązaniem problemu. Należy podkreślić, iż wpływ na tą sytuację mogą mieć czynniki zewnętrzne, które mogą niezależnie od działań samorządu uniemożliwić osiągnięcie przyjętych wartości docelowych.

Jeśli chodzi o bieżącą wartość wskaźnika aktywności gospodarczej to zarówno na obszarze rewitalizacji jak i na obszarze całej gminy uległa ona zmniejszeniu. Jednak przyczynę tej sytuacji można powiązać z wartością bieżącą wskaźnika pn.: Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku do 25 r.ż. na obszarze rewitalizacji w ogólnej populacji pozbawionych pracy, gdyż wskaźnik ten i na terenie obszaru rewitalizowanego i obszaru całej gminy uległ zmniejszeniu, co jest zjawiskiem pozytywnym. Bezrobocie maleje i liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych również maleje, a to może oznaczać, że osoby fizyczne zawieszają działalności gospodarcze i podejmują pracę zarobkową, m.in. u prywatnych przedsiębiorców. Dlatego też nie do końca można stwierdzić, że zmniejszenie wartości wskaźnika aktywności gospodarczej jest zjawiskiem negatywnym.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 wyznaczono 4 cele strategiczne rewitalizacji, tj.:

1. Rozwój aktywności i integracji społecznej przyczyniające się do włączenia społecznego;
2. Podniesienie poziomu edukacji na obszarze rewitalizowanym;
3. Rozwój aktywności zawodowej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji;
4. Integracja przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji.

Cele te są względem siebie komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty i problemy zidentyfikowane w obszarze rewitalizacji.

Na podstawie zebranych kart zadań i ankiet ewaluacyjnych, w tabeli nr 5 przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przypisanych poszczególnym celom strategicznym.

**Tabela 5 Stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przypisanych poszczególnym celom strategicznym**

Nazwa celu i działania	Nr i nazwa projektu	Produkty przedsięwzięcia		Rezultaty przedsięwzięcia		Stopień realizacji przedsięwzięcia [%]	
		osiągnięte (zrealizowane)	planowane	osiągnięte (zrealizowane)	planowane	produkt	rezultat
<b>Cel Strategiczny 1. Rozwój aktywności i integracji społecznej przyczyniające się do włączenia społecznego</b>							
Działanie 1.1 Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	2/SP Promocja aktywnego stylu życia	<b>Liczba zorganizowanych imprez, spotkań, kampanii</b>		<b>Liczba osób uczestniczących w imprezach, spotkaniach, kampaniach (osoby)</b>		25%	0%
		2 spotkania/ kampanie	2 spotkania /kampanie	0 osób	100 osób		
		<b>Ilość wydrukowanych ulotek, materiałów promocyjnych (w szt.)</b>					
		0 szt.	300 szt.				
	4/SP Głowa do góry. Nie jesteś sam.	<b>Liczba przeprowadzonych spotkań terapeutycznych, sesji rodzinnych, warsztatów</b>		<b>Zmiana orientacji z roszczeniowej na prospołeczną, wzrost poczucia własnej wartości oraz wpływu na swoje życie i możliwości dokonania zmiany w swoim życiu, poprawa więzi społecznych, rodzinnych partnerskich</b>		5,33%	0%
		8 warsztatów	67 warsztatów	0 osób	5 osób		
		<b>Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie</b>					
		0 osób	10 osób				
	7/SP Coroczny festyn rodzinny w Kuźnicy Czeszyckiej	<b>Liczba zorganizowanych festynów dla dzieci</b>		<b>Liczba osób uczestniczących w corocznym festynie</b>		28,56%	0%
2 festyny		5 festynów	0 osób	300 osób			
Działanie 1.2 Wspieranie rozwoju i integracji w tym wspieranie organizacji pozarządowych	6/SP Aktywizacja seniorów	<b>Liczba utworzonych nieformalnych klubów seniora</b>		<b>Liczba osób należących do nieformalnych klubów seniora</b>		67,65%	28%
		1 klub	0	7 osób	18 osób		
		<b>Ilość zorganizowanych wyjazdów i zajęć plenerowych</b>					
	30 wyjazdów/ spotkań	55 zajęć /spotkań/ wyjazdów					
	8/SP Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich	<b>Liczba nieformalnych utworzonych grup integracyjnych</b>		<b>Liczba osób należących do nieformalnych grup integracyjnych</b>		0%	0%
	1 grupa		8 osób				
Działanie 1.3 Inwestycje w infrastrukturę kulturalną i rekreacyjno-sportową	4/4/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej (Stara Huta)	<b>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (w ha)</b>		<b>Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów (osoby)</b>		0%	0%
		0,030 ha		206 osób			
		<b>Liczba terenów publicznych poddanych rewitalizacji (w szt.)</b>					
	1 szt.						
	3/8/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie OSP oraz placu zabaw na cele integracji społeczności wiejskiej (Brzostowo z Brzostówkiem)	<b>Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (w ha)</b>		<b>Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów (osoby)</b>		0%	0%
		0 ha	0,213 ha	0 osób	326 osób		
<b>Liczba terenów publicznych poddanych rewitalizacji (w szt.)</b>							
0 szt.		1 szt.					

	1/8/INF Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (Kuźnica Cz.)	<b>Liczba wybudowanych obiektów kulturalnych zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze (w szt.)</b>	<b>Liczba osób korzystających z obiektu (osoby)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		1 szt.	297 osób		
		<b>Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w szt.)</b>			
		1 szt.			
	1/9/INF Budowa zewnętrznej siłowni fitness przy świetlicy wiejskiej (Kuźnica Cz.)	<b>Liczba wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych na rewitalizowanym obszarze (w szt.)</b>	<b>Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (osoby)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		1 szt.	150 osób		
	2/5/INF Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP (Grabownica)	<b>Liczba wspartych obiektów rekreacyjnych na rewitalizowanym obszarze (w szt.)</b>	<b>Liczba użytkowników korzystających z powstałej infrastruktury (osoby)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		0 szt.	1 szt.	0 osób	48 osób
		<b>Powierzchnia wspartych terenów rekreacyjnych (w m<sup>2</sup>)</b>			
		0 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>		
	2/6/INF Budowa boiska wraz z zakupem i montażem bramek i ławek (Grabownica)	<b>Liczba zrewitalizowanych obiektów sportowych (w szt.)</b>	<b>Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury rekreacyjnej (osoby)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		1 szt.	213 osób		
		<b>Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej (w m<sup>2</sup>)</b>			
		8 662 m <sup>2</sup>			
	3/5/INF Modernizacja boiska wraz z zakupem wyposażenia (bramki, ławki) (Bzostowo z Brzostówkiem)	<b>Liczba zrewitalizowanych obiektów sportowych (w szt.)</b>	<b>Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury rekreacyjnej (osoby)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		0 szt.	1 szt.	0 osób	326 osób
		<b>Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej (w m<sup>2</sup>)</b>			
		0 m <sup>2</sup>	8 800 m <sup>2</sup>		
<b>Cel Strategiczny 2. Podniesienie poziomu edukacji na obszarze rewitalizowanym</b>					
Działanie 2.1 Podniesienie poziomu świadczonych usług edukacyjnych	1/10/INF Wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej i matematycznej w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej	<b>Liczba wspartych obiektów infrastruktury ogólnej (w szt.)</b>	<b>Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w projekcie (osoby)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		1 szt.	140 uczniów		
	1/11/INF Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o 10 miejsc parkingowych	<b>Liczba miejsc postojowych powstałych w ramach budowy parkingu</b>	<b>Liczba użytkowników korzystających z miejsc postojowych powstałych na wybudowanym parkingu (osoby)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	10 miejsc	160 osób			
1/12/INF Rozbudowa Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o pomieszczenia do wydawania posiłków, zmywalnię oraz stołówkę	<b>Liczba rozbudowanych obiektów świadczących usługi edukacyjne (w szt.)</b>	<b>Liczba uczniów korzystających ze stołówki</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
	1 szt.	100 osób			

	1/8/INF Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (Kuźnica Cz.)	<b>Liczba wybudowanych obiektów kulturalnych zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze (w szt.)</b>	<b>Liczba osób korzystających z obiektu (osoby)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
		1 szt.	297 osób		
Działanie 2.2. Integracja i edukacja dzieci i młodzieży		<b>Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w szt.)</b>			
		1 szt.			
	3/SP Edukacja, aktywizacja, zabawa	<b>Liczba zorganizowanych zajęć w okresie wakacji i ferii zimowych (godziny)</b>	<b>Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach (osoby)</b>	<b>33,47%</b>	<b>0%</b>
		164 godz.	326 godz.	0 osób	96 osób
<b>Cel strategiczny 3. Rozwój aktywności zawodowej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji</b>					
Działanie 3.1 Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem	1/SP Aktywni na rynku pracy	<b>Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie (osoby)</b>	<b>Liczba osób, które uzyskały/podniosły swoje kwalifikacje</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>
		2 osoby	18 osób		
Działanie 3.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			<b>Liczba osób, które otworzyły działalność gospodarczą</b>		
			0 osób	4 osoby	
<b>Cel strategiczny 4. Integracja przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji</b>					
Działanie 4.1 Budowa, modernizacja i remonty dróg, chodników, oświetlenia ulicznego i Działanie 4.2 Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	1/1/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 201, 203 (Kuźnica Cz.)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>	<b>Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza</b>	<b>29,30%</b>	<b>0%</b>
		0,510 km	0,617 km	po realizacji projektu	
		<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>			
		4 szt.	26 szt.		
	1/2/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjnej nr 192 (Kuźnica Cz.)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>	<b>Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
			0,150 km	po realizacji projektu	
		<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>			
			2 szt.		

1/3/INF Przebudowa drogi na terenie ARIMR oraz odcinka drogi gminnej położonych na działkach nr 27, 209/5, 33/1 (Kuźnica Cz.)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	100%	100%
	0,200 km	0			
1/4/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 208 (Kuźnica Cz.)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	0%	0%
		0,300 km			
1/5/INF Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1436 i 1446 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Kuźnica Cz.)	<b>Długość wybudowanych chodników (w km)</b>		Liczba osób korzystających z nowo powstałej infrastruktury (osoby)	0%	0%
		2,500 km			
	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym	Po realizacji projektu	
	5 szt.				
1/6/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych na działkach nr 129/8 i 202 (Kuźnica Cz.)	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>		Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców	33,33%	0%
	11 szt.	22 szt.			

1/11/INF Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o 10 miejsc parkingowych	<b>Liczba miejsc postojowych powstałych w ramach budowy parkingu</b>		<b>Liczba użytkowników korzystających z miejsc postojowych powstałych na wybudowanym parkingu (osoby)</b>		0%	0%
		10 miejsc		160 osób		
2/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 254 od skrzyżowania do boiska gminnego (Grabownica)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>		<b>Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza</b>		100%	100%
	0,165 km	0	Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i otoczenia uległa polepszeniu, itp.			
2/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 255 wraz z budową oświetlenia ulicznego i chodnikiem na odcinku na wysokości od działki nr 25/1 do działki 30/3 (Grabownica)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>		<b>Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza</b>		33,33%	0%
	0 km	1,300 km	Po realizacji projektu			
	<b>Długość wybudowanych chodników (w km)</b>					
	0 km	0,450 km				
	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>					
14 szt.	0					
2/3/INF Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1436 (Grabownica)	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>		<b>Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców</b>		0%	0%
		5 szt.		Po realizacji projektu		

2/7/INF Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 256 obręb Grabownica oraz nr 219 obręb Brzostowo o łącznej długości ok. 3,5 km	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	0%	0%	
		3,500 km				Po realizacji projektu
3/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 222 (Brzostowo z Brzostówkiem)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	100%	100%	
	0,180 km	0				Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i otoczenia uległa polepszeniu, itp.
3/2/INF Przebudowa drogi na działce nr 104/12 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Brzostowo z Brzostówkiem)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	0%	0%	
		0,100 km				Po realizacji projektu
	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>					
		3 szt.				



3/3/INF Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 104/39 (Brzostowo z Brzostówkiem)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	0%	0%	
	0,100 km				Po realizacji projektu
3/4/INF Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 241/10 w Brzostówku wraz z budową oświetlenia ulicznego	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	0%	0%	
	0,100 km				Po realizacji projektu
	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>				
	3 szt.				
3/7/INF Budowa drogi gminnej na działkach nr 256 obręb Grabownica oraz nr 219 obręb Brzostowo o łącznej długości ok. 3,5 km	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	0%	0%	
	3,500 km				Po realizacji projektu
3/9/INF Zakup i montaż przystanków PKS w Brzostowie i Brzostówku	<b>Ilość zamontowanych przystanków autobusowych (w szt.)</b>	Liczba osób korzystających z obiektów (osoby)	0%	0%	
	3 szt.				47 osób

4/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 362 i 363 (Stara Huta)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>		<b>Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza</b>		0%	0%
		0,300 km		Po realizacji projektu		
4/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 375/3 (Stara Huta)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>		<b>Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza</b>		100%	100%
	0,330 km	0	Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i otoczenia uległa polepszeniu, itp.			
4/3/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1435 (Stara Huta)	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>		<b>Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców</b>		100%	100%
	3 szt.	0	Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard i jakość życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa wśród mieszkańców.			

	4/5/INF Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1437 na odcinku 1,1 km (Stara Huta)	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>		<b>Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców</b>		0%	0%
			44 szt.		Po realizacji projektu		
Działanie 4.2 Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	5/SP Bezpieczny uczeń	<b>Liczba zorganizowanych pogadank, spotkań dla uczniów</b>		<b>Liczba uczniów uczestniczących w pogadankach, spotkaniach</b>		28,56%	0%
		2 warsztaty	5 warsztatów	0 uczniów	140 uczniów		
				<b>Podniesienie świadomości konsekwencji używania (spożywania) środków odurzających, podniesienie umiejętności dzieci (uczniów) w poruszaniu się w ruchu drogowym</b>			
				0 uczniów	100 uczniów		
Działanie 4.3 Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	2/4/INF Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia techniczno-socjalne wraz z węzłem sanitarnym (Grabownica)	<b>Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych</b>		<b>Powierzchnia użytkowa rozbudowanego budynku OSP (w m<sup>2</sup>)</b>		0%	0%
		0 szt.	1 szt.	0 m <sup>2</sup>	230 m <sup>2</sup>		
	3/6/INF Termomodernizacja budynku remizy OSP (Brzostowo z Brzostówkiem)	<b>Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych</b>		<b>Powierzchnia użytkowa rozbudowanego budynku OSP (w m<sup>2</sup>)</b>		100%	100%
		1 szt.	0	110 m <sup>2</sup>	0		
Działanie 4.4 Zapewnienie dostępności mieszkańców do podstawowych usług komunalnych	1/7/INF Zmiana technologii uzdatniania wody w stacji w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z modernizacją SUW oraz modernizacją przepompowni sieciowej i budowa sieci tranzytowej o długości 4,082 km (Kuźnica Cz.)	<b>Liczba zmodernizowanych przepompowni wody (w szt.)</b>		<b>Wydajność dobową zmodernizowanej stacji uzdatniania wody (m<sup>3</sup>/d)</b>		100%	100%
		1 szt.	0	800 m <sup>3</sup> /d	0		
		<b>Długość wybudowanej sieci tranzytowej (w km)</b>					
		4069,38m	0				

Na tym etapie prac nad programem nie można ocenić czy osiągnięto zaplanowane cele. Jest jeszcze za wcześnie i za mało zostało zaangażowanych środków finansowych w stosunku do zaplanowanego budżetu.

Można stwierdzić, iż projekty społeczne z uwagi na ich charakter są trudniejsze do realizacji. Niemniej jednak to realizacja tych projektów może przyczynić się do zmian, które uznać będzie można za trwałe. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na kwestie realizacji zadań wspierających osiągnięcie tych celów.

#### **IV. Rekomendacje oraz plan realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 w kolejnych latach**

##### Analiza zagrożeń dla realizacji planowanych działań

Obecnie trudno jest wskazać zagrożenia dla realizacji planowanych działań, ponieważ do tej pory przedsięwzięcia rewitalizacyjne są realizowane zgodnie z wyznaczonym w Programie zakresem rzeczowym i terminem.

##### Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji GPR

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do aktualizacji GPR. W sytuacji gdy pojawi się taka konieczność stosowny materiał zostanie przedyskutowany z Komitetem Rewitalizacji oraz przedstawiony Wójtowi Gminy Krośnice, a następnie projekt uchwały przedłożony zostanie Radzie Gminy Krośnice w celu podjęcia stosownej uchwały oraz po podjęciu przez Radę Gminy Krośnice przesłany do oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

##### Plan realizacji GPR w kolejnych latach

Do tej pory Gminny Program Rewitalizacji wdrażany jest prawidłowo, duża część projektów została zrealizowana lub rozpoczęła się ich realizacja. Na dzień dzisiejszy nie odnotowano większych uwag, aby plan realizacji programu na kolejne lata w jakiś sposób usprawnić lub zmienić.

Zatwierdzam: 11.07.2019r.

WÓJT GMINY  
*A. Bratki*  
mgr Andrzej Bratki
